

都市再生整備計画 事後評価シート
羽黒地区

平成26年 3月

愛知県犬山市

様式2-1 評価結果のまとめ


都道府県名	愛知県		市町村名	犬山市		地区名	羽黒地区		面積	257ha		
交付期間	平成21年度～平成25年度		事後評価実施時期	平成25年度		交付対象事業費	449.3百万円 国費率 0.361					
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名									
			基幹事業	道路：羽黒駅西広場整備事業・市道羽黒東433号線整備事業・市道羽黒東179号線整備事業、公園：妙楽寺跡公園整備事業、地域生活基盤施設：羽黒城址西口広場整備事業・耐震性貯水槽整備事業								
	当初計画から削除した事業		提案事業	地域創造支援事業：羽黒南子ども未来園耐震等改修事業・羽黒子ども未来園耐震等改修事業・南部高齢者活動センターバリアフリー化事業・防犯灯等設置事業、事業活用調査：事業効果調査分析事業								
			事業名	削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
	新たに追加した事業		基幹事業	なし								
			提案事業	南部高齢者活動センターバリアフリー化事業			別事業等に対応するため削除			影響なし		
交付期間の変更		当初	平成21年度～25年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響							
		変更	平成 年度 ～ 年度									
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
	指標1	歩行者の安全性満足度	%	24.5	H20 38.0	H25 38.0	54.5	○	あり	市道整備やウォーキングトレイル事業等により、歩行者の安全性満足度は着実に向上している。羽黒駅西広場の整備等により、歩行者の安全性満足度の更なる向上が期待される。	H.26.7	
	指標2	コミュニティ活動の活性度	%	100	H19 130	H25 117	133	○	あり	羽黒城址西口広場整備をはじめとした公園・広場整備や関連事業であるウォーキングトレイル事業等の進捗により、竹林や五条川を活用したまちづくり活動の活性化効果が発現している。	H.26.7	
	指標3	防災性が求められる施設等の整備率	%	54	H19 88	H25 88	88	○	あり	子ども未来園耐震等改修事業や耐震性貯水槽整備事業および小学校の耐震化、道路整備等により、地区の防災性向上の効果が着実に発現している。	H.26.7	
	指標4											
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
	その他の数値指標1											
その他の数値指標2												
4) 定性的な効果発現状況	<ul style="list-style-type: none"> 羽黒まちづくり委員会の活動が充実しており、特に竹林活用等に対する要望・問題提起が多くなるようになり、まちづくりに対する意識が向上している。 地元の団体による活動や、外部から本地域の資源活用がなされるなど、まちづくり活動が広がりをみせている。 											
5) 実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等				
	モニタリング	指標に関わるバックデータによるモニタリング		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 指標に係わるバックデータで確認する。				
	住民参加プロセス	地域活動充実のための施設整備とまちづくり活動の活性化		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 今後も継続して実施する。				
	持続的なまちづくり体制の構築	事業の協議・調整や進捗状況の検証の実施		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 地域住民との継続的な情報交換が行えるような体制を構築する。				

様式2-2 地区の概要

羽黒地区(愛知県犬山市) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
	指標	単位	数値	水準	数値	水準	数値	水準
○「羽黒の魅力を実感できる 歩いて楽しい活力あふれるまちづくり」 (目標1) 駅周辺の環境と羽黒中央公園との連続性を活かした賑わいのあるまち (目標2) 水辺と歴史文化を活かした魅力あるまち (目標3) 安全に安心して暮らせる人にやさしいまち	歩行者の安全性満足度	単位: %	24.5	H20	36.0	H25	54.5	H25
	コミュニティ活動の活性度	単位: %	100	H19	130	H25	133	H25
	防災性が求められる施設等の整備	単位: %	54	H19	88	H25	88	H25

■羽黒城址西口広場整備事業

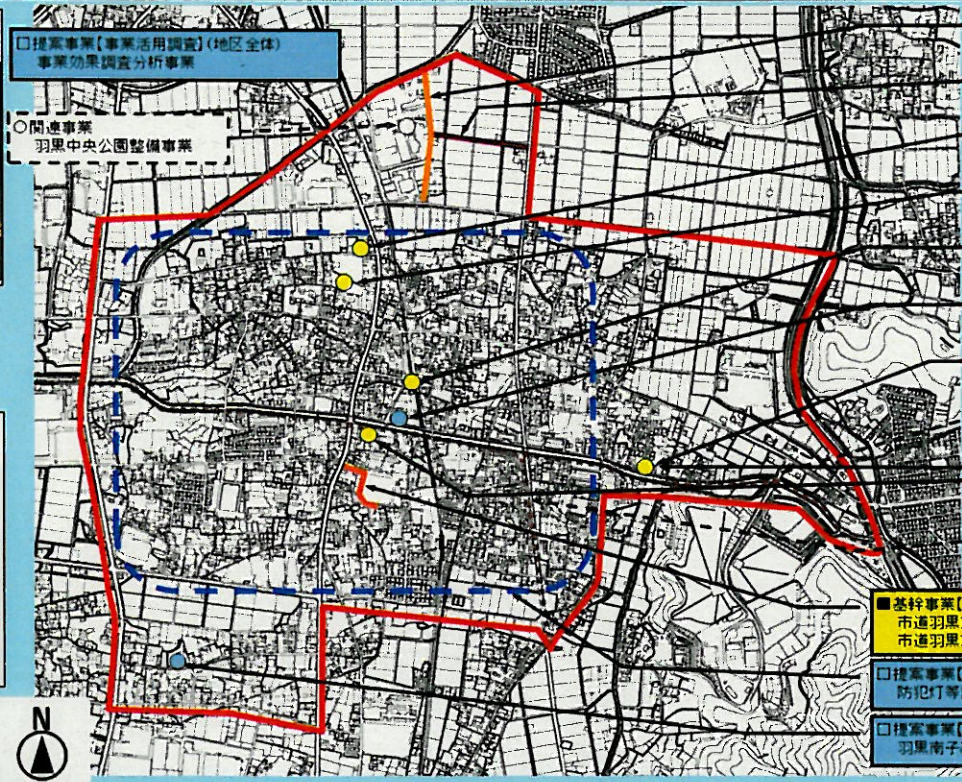

- 基幹事業【道路】市道羽黒東62号線整備事業
- 基幹事業【下水道】竹ノ腰地区汚水管きょ整備事業
- 基幹事業【地域生活基盤施設】磨墨塚史跡広場整備事業
- 基幹事業【地域生活基盤施設】羽黒城址西口広場整備事業
- 基幹事業【道路】羽黒駅西広場整備事業
- 提案事業【地域創造支援事業】羽黒子ども未来園耐震等改修事業
- 基幹事業【公園】妙楽寺跡公園整備事業
- 関連事業ウォーキングトレイル整備事業
- 基幹事業【地域生活基盤施設】耐震性貯水槽整備事業
- 関連事業富岡井線整備事業
- 基幹事業【道路】市道羽黒東433号線整備事業
市道羽黒東179号線整備事業
- 提案事業【地域創造支援事業】防犯灯等設置事業
- 提案事業【地域創造支援事業】羽黒南子ども未来園耐震等改修事業

■羽黒駅西広場整備事業



■市道羽黒東433・179号線整備事業



□羽黒子ども未来園耐震等改修事業



凡例

■	基幹事業
□	提案事業
- - -	関連事業

まちの課題の変化

「達成された課題」
 ・現在は羽黒駅西広場が整備中であるが、今年度中に整備を行い車両と歩行者の分離がされることにより、羽黒駅での歩行者の安全性が確保される。
 ・羽黒中央公園が整備されることに伴い、市道羽黒東62号線整備事業などにより、羽黒中央公園へのアクセスを考慮した交通利便性・安全性の確保が図られている。
 ・磨墨塚史跡広場整備事業及び羽黒城址西口広場整備などにより、竹林広場の活用も含めた地域固有の資源活用が図られている。
 ・ウォーキングトレイル事業などにより、地域資源を結び、安全に楽しく歩くことのできる水・緑と歴史のネットワーク形成が図られている。
 ・羽黒城址および竹林の活用などにより、地域コミュニティの充実と羽黒の魅力づくりが進められている。また、地域住民の参画により整備内容を計画しているほか、整備後の活用も地域主体で実施することが期待される。
 ・耐震性貯水槽の設置や、子ども未来園に対する耐震改修、また、避難所に指定されている羽黒小学校へ道路拡幅を行うことにより、防災面や通学路の安全性確保を考慮した道路環境が向上している。
 「発生した新たな課題」
 ・特になし

今後のまちづくりの方策(改善策を含む)

- 地域固有の地域資源の有効活用…竹林および妙楽寺跡公園・羽黒城址西口広場・磨墨塚史跡広場の整備にあわせた有効的な利用の実施。(地域資源を活用したイベント等の継続的な開催の支援)
- 地域コミュニティの充実と羽黒の魅力づくり…地域主体のまちづくり活動等の継続・充実。(羽黒まちづくり委員会との継続的な情報交換)
